



Kofinanziert von der  
Europäischen Union



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch  
Steuermittel auf der Grundlage des vom  
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

## EFRE „Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung 2021-2027“ Stadt Falkenstein/Vogtland „Besser Leben im Karree“

### Newsletter November 2025


#### 3.1 Neugestaltung Außenbereich Begegnungszentrum

Die Arbeiten an der Baustelle gingen in den letzten Wochen gut voran. Der Vorbereich des Begegnungszentrums, der Spielplatz und die Sportfelder sind fertig gestellt.





Bei der Kletterwand mit Fallschutz konnten die Bauarbeiten ebenso abgeschlossen werden. Die Anordnung der Kletterelemente wird nach Lieferung gemeinsam mit den Betreuern des Begegnungszentrums festgelegt. Das im Boden eingelassene Trampolin im Bereich der Kletterwand ist auch installiert. In der Mitte des Geländes wurden Sitzstufen und eine Pergola gebaut. Momentan fehlen noch letzte Erd- und Elektroarbeiten. Die Pflanzarbeiten werden auch noch ausgeführt. Der weitere Baufortschritt ist abhängig vom Beginn des Winters vor Ort.

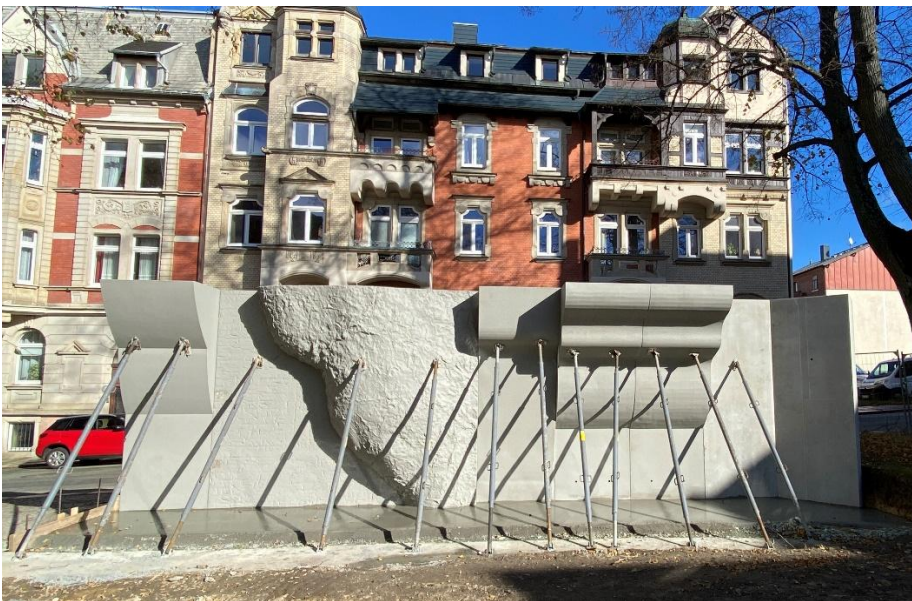

*Die frisch betonierte Kletterwand!*



*Es fehlen nur noch die Kletterelemente und die Pflanzarbeiten.*



Fotos: WGS mbH

### 3.2 Sanierung Kunstrasenplatz

Die Sanierung des Kunstrasenplatzes ist weitgehend abgeschlossen. Am 10.11. erfolgte die Abnahme der Bauleistungen, vorbehaltlich der Elektroarbeiten. Hier sind noch Restleistungen notwendig. Ebenso wird zu Beginn des neuen Jahres in Abhängigkeit des Baufortschritts des Neubaus der Tennisplätze der Vereinscontainer aufgestellt. Die Vereine dürfen den neuen Platz benutzen.



Fotos: WGS mbH

### 3.4 Neubau von 2 Tennisplätzen mit Beleuchtung

Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, die Fundamente für die aufzustellenden Garagen als Vereinscontainer errichtet. Der Asphalteinbau konnte in diesem Jahr nicht mehr erfolgen, somit wird dies und das Aufstellen der Container im Frühjahr fortgeführt.

Die Arbeiten an den Pfosten für die Ballfangzäune sind abgeschlossen, die Gittermatten zur Wiederverwendung werden derzeit im unteren Bereich montiert. Der Baufortschritt im oberen Bereich erfolgt in Abhängigkeit der Lieferung der neuen Matten. Die Arbeiten sind witterungsabhängig.



Fotos: WGS mbH

### 3.7 Sanierung Spielplatz Melanchthonstraße

Die Arbeiten wurden am 10.11. begonnen, die vorhandenen Spielelemente bereits abgerissen und die Bepflanzung zum Teil ausgebaut und zwischengelagert. Es erfolgt die Geländemodellierung und das Einbringen der Fundamente der neuen Spielelemente. Der Fortschritt der Arbeiten ist witterungsabhängig.



Fotos: WGS mbH
